

ОТЧЕТ  
об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:  
Кировский район города Ростова-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта:  
«Капитальный ремонт пищеблока в МБДОУ № 235, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького 217/60»
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:  
16.06.2025 – 31.07.2025.
- 4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу
1	2	3	4
1.	Капитальный ремонт пищеблока в МБДОУ № 235, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.М.Горького, 217/60	798,48 тыс.руб.	Индивидуальный предприниматель Канин Максим Александрович
2.	Подготовка помещений к проведению ремонтных работ. Демонтаж кухонного оборудования, вынос кухонного оборудования и мебели. Упаковка имущества и кухонного оборудования перед ремонтом. Уборка помещений после ремонта. Мытье стен, окон, пола. Расстановка кухонного оборудования и мебели после ремонта. Монтаж кухонного оборудования.	Трудовое участие	90 человек
3.	Предоставление	Имущественное участие	Лабурец А.Л.


	хозяйственного инвентаря для уборки, в количестве 10 шт.		
	Предоставление штор, в количестве 3 шт.	Имущественное участие	Абрамян И.А.
	Предоставление разделочных досок, в количестве 5 шт.	Имущественное участие	Лобойко И.М.
	Предоставление контейнеров с крышкой 18 л. для хранения продуктов в количестве 8 шт.	Имущественное участие	Госман И.Ю.
	Итого	798,48 тыс.руб.	

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	Сумма (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)	Сумма (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	1 036,38	100	798,48	100
объем средств местного бюджета	932,68	90	718,63	90,0
объем инициативных платежей физических лиц	103,70	10	79,85	10,0
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	0,00	0	0,00	0
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта"	Экономия в сумме 237,9 образовалась в результате открытого аукциона в электронной форме, заключение дополнительного соглашения на уменьшение цены контракта (на основании локальных сметных расчетов на включаемые и исключаемые работы).			

## 5. Фотоматериалы 4-5 ракурса

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1.	   <p data-bbox="269 2024 440 2063">Пищеблок</p>	   <p data-bbox="880 2024 1051 2063">Пищеблок</p>

2.

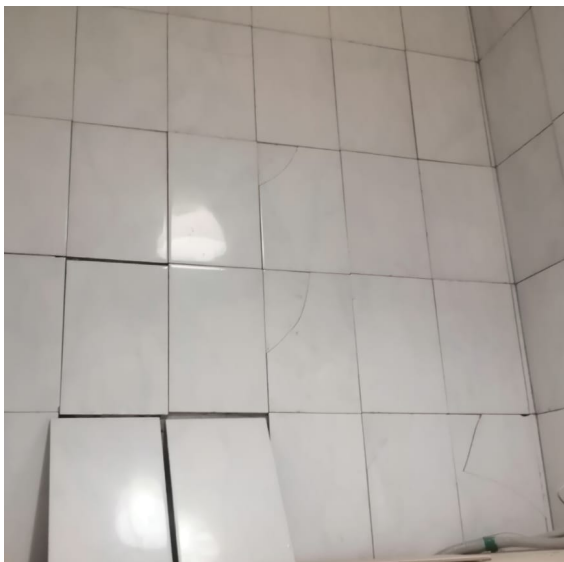

Кладовая сыпучих продуктов



Кладовая сыпучих продуктов

3.



Кладовая сырой продукции



Кладовая сырой продукции

4.



Место хранения тары готовой продукции



Место хранения тары готовой продукции
